

PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PJERJ

Resultado consolidado

SETEMBRO/2025



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria-Geral de Governança,
Inovação e Compliance
SGGIC

Departamento de Governança
e Planejamento Estratégico
DEGEP


Sumário

MAPA ESTRATÉGICO	3
PROJETOS ESTRATÉGICOS – BIÊNIO 2025/2026	4
Implementação dos Projetos Estratégicos.....	5
Situação dos Projetos Estratégicos – até setembro/2025	7
Execução Orçamentária - Exercícios 2025 e 2026.....	8
Percentual de implementação – até setembro/2025	9
Divisão de Acessibilidade e Protocolo (GABPRES/ASCER/DIACP)	10
Departamento de Segurança da Informação (GABPRES/DESEG)	11
Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)	12
Secretaria-Geral de Gestão do Conhecimento (SGCON).....	13
Secretaria-Geral de Segurança Institucional (SGSEI)	16
Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC)	18
Secretaria-Geral de Dados Gerenciais e Análise de Indicadores (SGDAI)	20
Secretaria-Geral Judiciária (SGJUD)	21
Secretaria-Geral de Logística (SGLOG).....	22
Secretaria Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS)	24
Diretoria-Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial (CGJ/DGFAJ).....	26
Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais (COJES).....	27

MAPA ESTRATÉGICO

É a representação gráfica da estratégia institucional, contemplando os Direcionadores, Macrodesafios e Objetivos Estratégicos.

Cada Macrodesafio deve contribuir em sucessão com os demais, até que todos interajam para o alcance dos objetivos da organização.

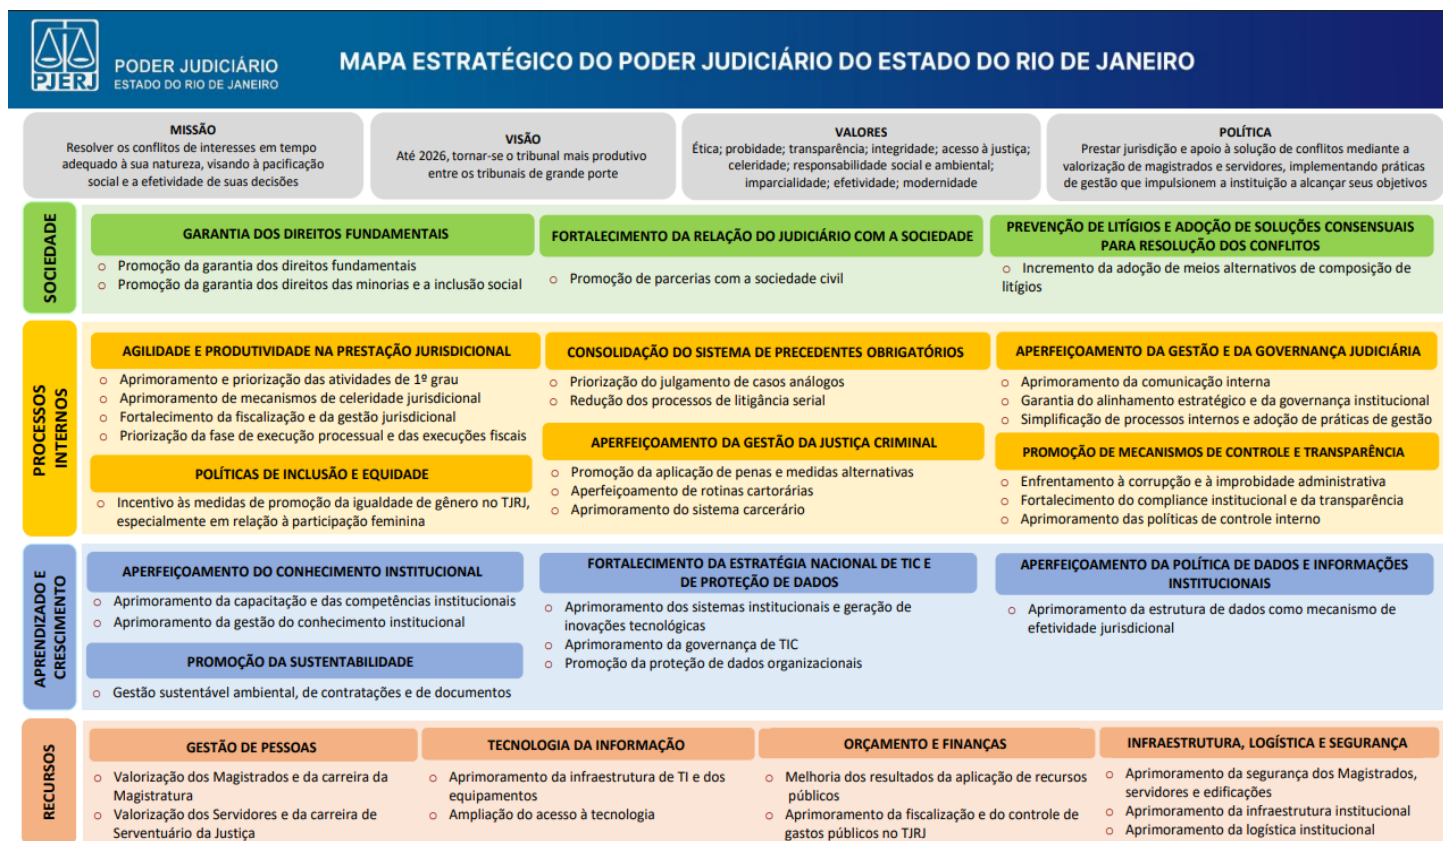

PROJETOS ESTRATÉGICOS – BIÊNIO 2025/2026

O Plano Estratégico foi revisado pela COGEP contemplando 15 Projetos Estratégicos aprovados pela Administração Superior do PJERJ. Seguindo a diretriz estabelecida pelo Desembargador Ricardo Couto de Castro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dos 15 projetos, 2 são de continuidade, a fim de garantir que ações importantes iniciadas sejam continuadas, condição necessária à efetividade e à eficiência operacional ([ATO EXECUTIVO TJ Nº 82/ 2025](#)).

13

NOVOS PROJETOS

1. Acessibilidade em Eventos e Cerimônias Institucionais;
2. Adaptação da Resolução CNJ 591 às Rotinas da Sessão Virtual;
3. Aprimoramento da Difusão do Conhecimento;
4. Aprimoramento dos mecanismos processuais com o uso da mediação para solução nos procedimentos apuratórios oriundos dos contratos administrativos firmados no âmbito no PJERJ.
5. ASSIS;
6. Bem-vindo ao Passado;
7. Central de Atendimento da Primeira Instância;
8. Refinamento das Configurações do WEB Application Firewall para proteção das aplicações críticas do TJRJ;
9. Implantação do Monitoramento e Gestão de Alarmes Presencial e Pânico dos Fóruns e Comarcas do Estado do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Segurança do PJERJ (CISPJ);
10. Julgar + Metas 1 e 2 CNJ;
11. Petição Cidadã;
12. Programa de Descarbonização e Inovação Tecnológica Sustentável do TJRJ;
13. Solução de Automação para Operação das Salas de Acautelamento com Recurso de Intertravamento por Monitoramento de Imagens e Reconhecimento Facial.


02

CONTINUIDADE

1. Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico;
2. Implantação do Sistema e-Proc.

Implementação dos Projetos Estratégicos


POR BIÊNIO

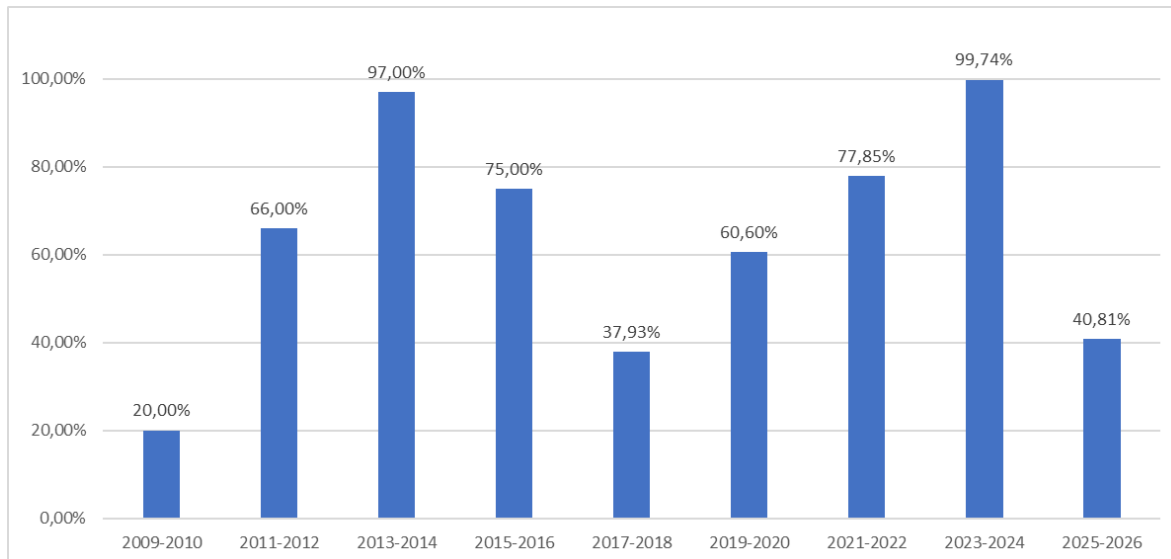

EM RELAÇÃO AO BIÊNIO - 2025/2026




EVOLUÇÃO BIÊNIO 2025-2026

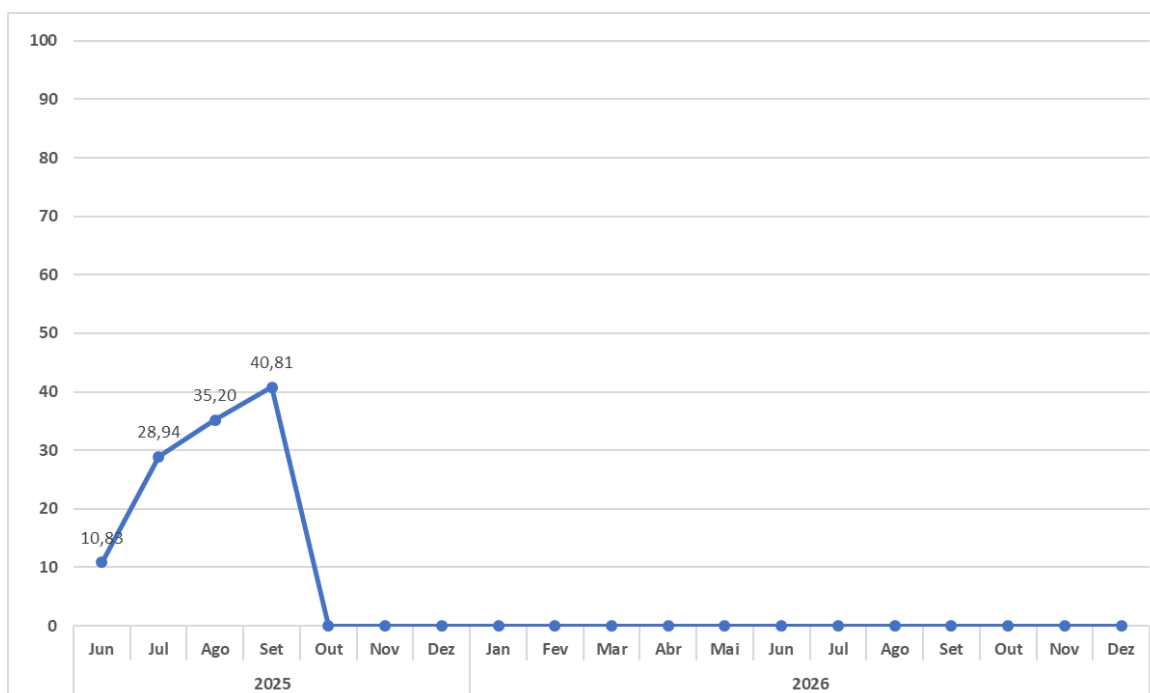



Observação: O acompanhamento dos projetos iniciou em junho/2025 a partir do cadastro das informações no sistema GRP pelas unidades gestoras.

ATÉ SETEMBRO/2025

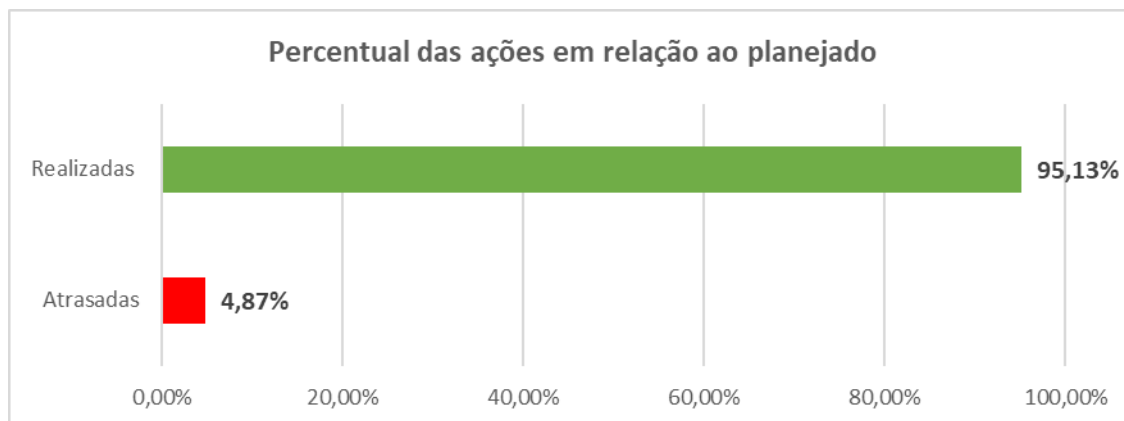

Situação dos Projetos Estratégicos – até setembro/2025

Situação	Identificação (GRP)	Nome do Projeto Estratégico
ATRASADO	71	Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Continuidade)
	104	Bem-vindo ao Passado
	106	Implantação do monitoramento e gestão de alarmes presencial e pânico dos fóruns e comarcas do Estado do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Segurança do PJE RJ (CISPI)
NO PRAZO	109	Acessibilidade em Eventos e Cerimônias Institucionais
	110	Aprimoramento da Difusão do Conhecimento
	112	Aprimoramento dos mecanismos processuais com o uso da mediação para solução nos procedimentos apuratórios oriundos dos contratos administrativos firmados no âmbito no PJE RJ
	108	ASSIS
	114	Central de Atendimento da Primeira Instância
	105	Refinamento das Configurações do WEB Application Firewall para proteção das aplicações críticas do TJRJ
	103	Implantação do Sistema e-Proc (continuidade)
	116	Julgar + Meta 1 e 2 CNJ
	111	Petição Cidadã
	113	Programa de Descarbonização e Inovação Tecnológica Sustentável do TJRJ;
CONCLUÍDO	107	Solução de Automação para Operação das Salas de Acautelamento com Recurso de Intertravamento por Monitoramento de Imagens e Reconhecimento Facial
	115	Adaptação da Resolução CNJ 591 às Rotinas da Sessão Virtual

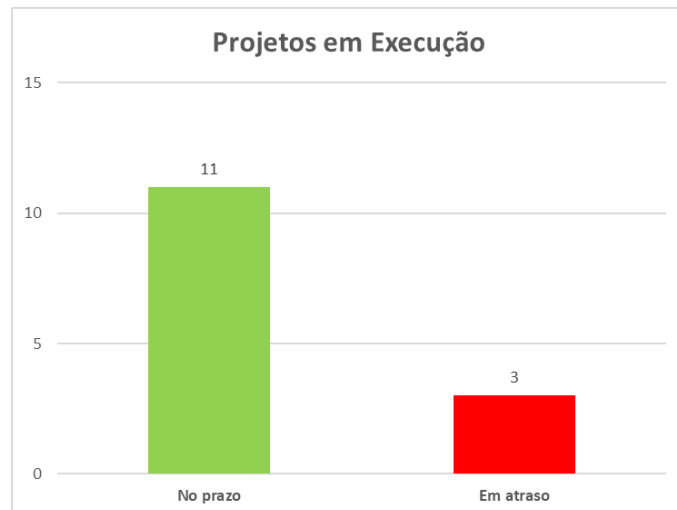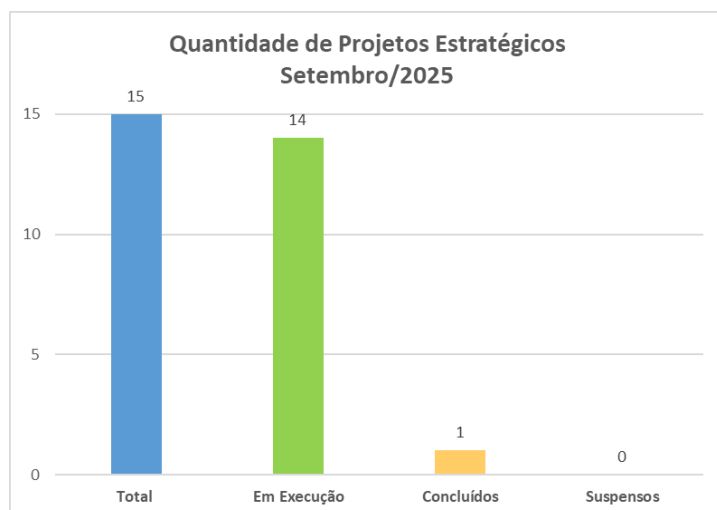


Execução Orçamentária - Exercícios 2025 e 2026

<i>Unidade</i>	<i>ID GRP</i>	<i>Nome do Projeto Estratégico</i>	<i>CUSTO ESTIMADO APROVADO*</i>	<i>CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO NO SISTEMA GRP</i>	<i>ORÇAMENTO EXECUTADO **</i>
CGJ/ DGFAJ	114	Central de Atendimento da Primeira Instância	A definir	R\$ 754.077,12	-
COJES	111	Petição Cidadã	Sem custos	Sem custos	-
GABPRES/DESEG	105	Refinamento das Configurações do WEB Application Firewall para proteção das aplicações críticas do TJRJ	Sem custos	Sem custos	-
GABPRES/ASCER/DIACP	109	Acessibilidade em Eventos e Cerimônias Institucionais	R\$ 125.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
SGCOL	112	Aprimoramento dos mecanismos processuais com o uso da mediação para solução nos procedimentos apuratórios oriundos dos contratos administrativos firmados no âmbito no Pjerj	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
SGCON	110	Aprimoramento da Difusão do Conhecimento	R\$ 500.000	R\$ 3.847.500,00	R\$ 0,00
SGCON/DEGEA	104	Bem-vindo ao passado	Contratação de equipe especializada: R\$ 120 mil por mês Serviço de digitalização: R\$ 15 milhões	R\$ 3.670.000,00	R\$ 0,00
SGSUS	113	Programa de Descarbonização e Inovação Tecnológica Sustentável do TJRJ.	R\$ 15 a 20 milhões	R\$ 35.230.000,00	R\$ 0,00
SGDAI	116	Julgar + Metas 1 e 2 CNJ	Sem custos	Sem custos	-
SGJUD	115	Adaptação da Resolução CNJ 591 às Rotinas da Sessão Virtual	A definir	R\$ 704.490,45	-
SGLOG	71	Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – Anexo 1	R\$ 26.180.772,96	R\$ 23.443.591,83	-
SGSEI	106	Implantação do monitoramento e gestão de alarmes presencial e pânico dos fóruns e comarcas do Estado do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Segurança do Pjerj (CISPJ)	R\$ 417.800,00	R\$ 526.080,00	R\$ 0,00
	107	Solução de automação para operação das salas de acautelamento com recurso de intertravamento por monitoramento de imagens e reconhecimento facial	R\$ 262.000,00	R\$ 262.000,00	R\$ 0,00
SGTEC	108	ASSIS	Sem custos	Sem custos	-
	103	Implantação do sistema e-Proc	Sem custos	Sem custos	-

* Aprovado pela Administração.

**Fonte: SGPCF/ASPLO – 18/07/2025 (informações prestadas semestralmente)

Percentual de implementação – até setembro/2025

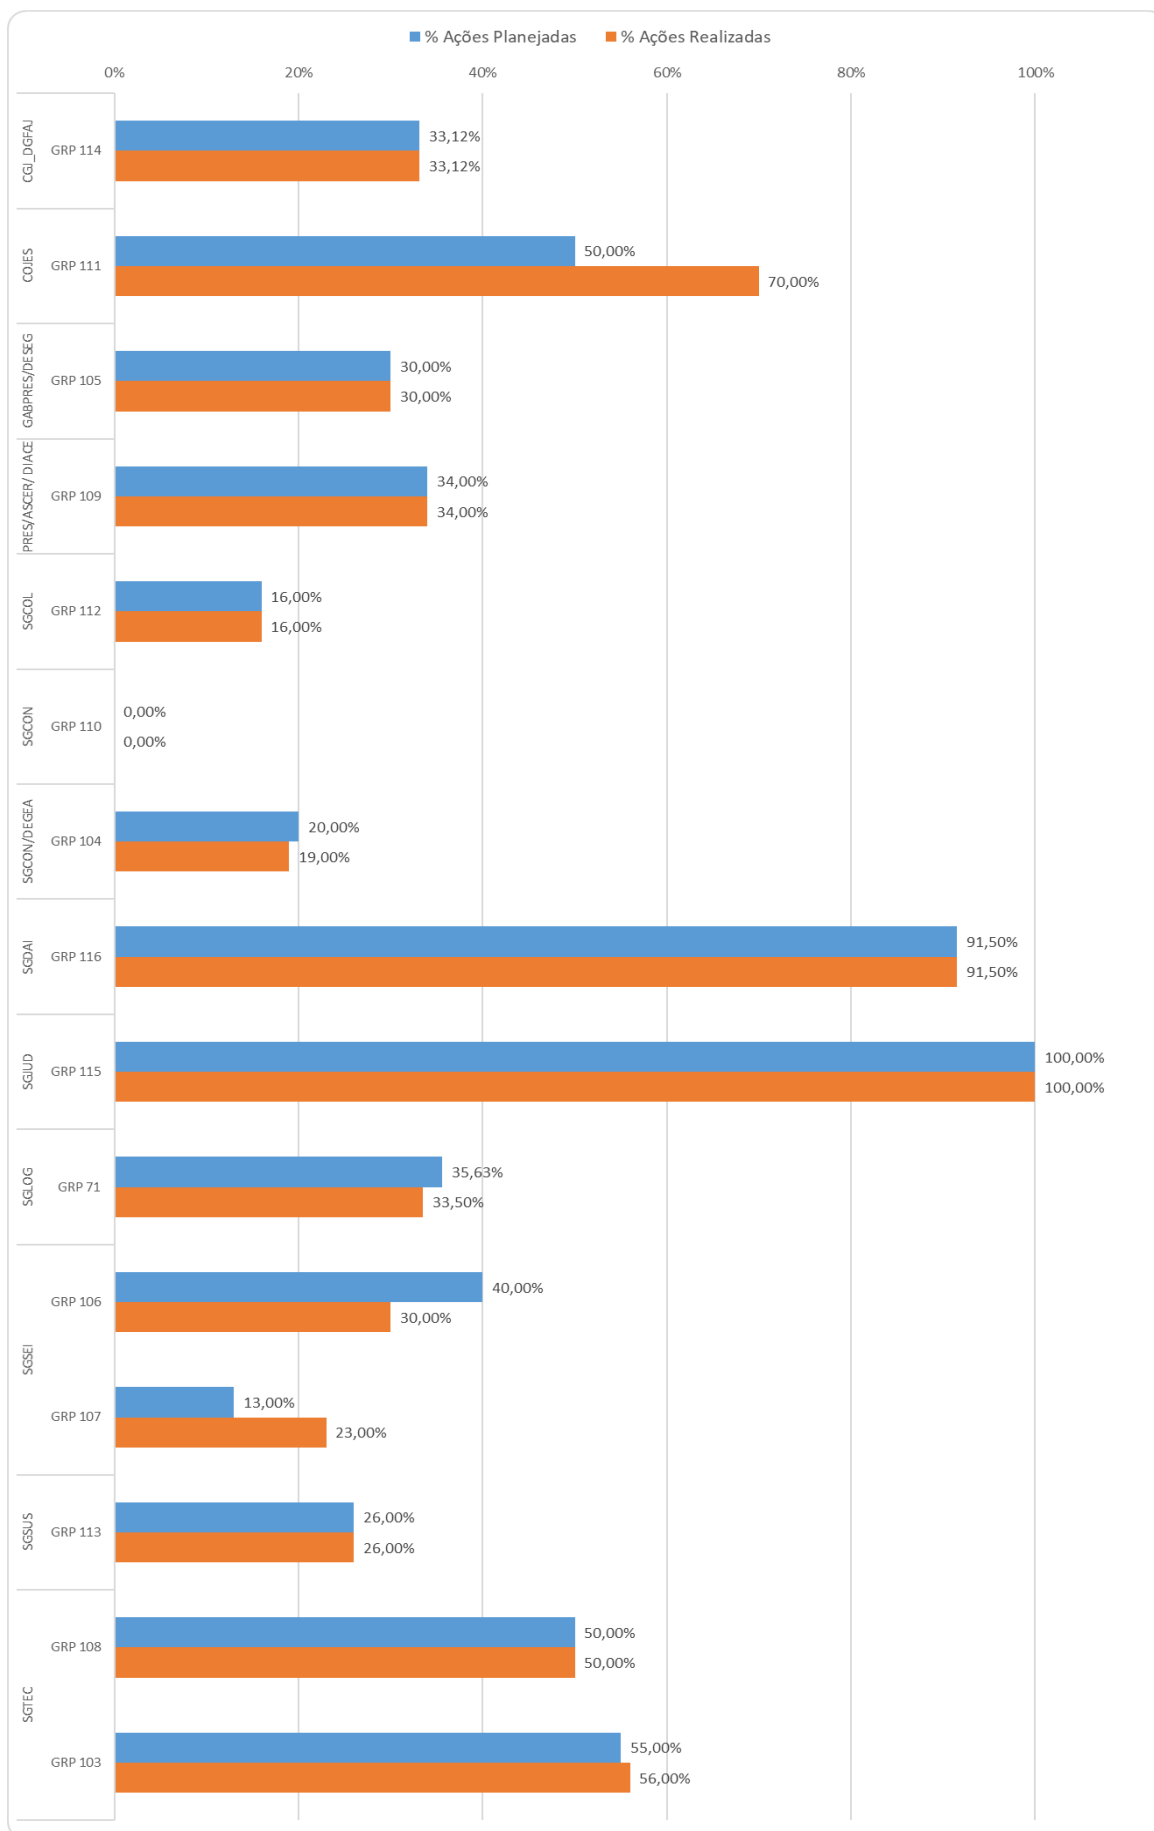

Divisão de Acessibilidade e Protocolo (GABPRES/ASCER/DIACP)

Acessibilidade em Eventos e Cerimônias Institucionais- GRP 109

STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Síntese do Escopo

Desenvolvimento e implementação de um Protocolo de Acessibilidade para cerimônias e eventos institucionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo diretrizes, treinamentos e infraestrutura adaptada, para redução de barreiras tecnológicas, arquitetônicas, atitudinais e nas comunicações.

Gerente

Luciana Lopes Vianna



Macrodesafio

Garantia dos direitos fundamentais


Objetivo estratégico

Promoção da garantia dos direitos das minorias e inclusão social

Evolução do projeto

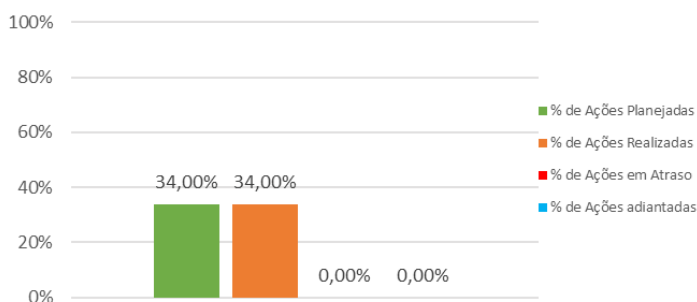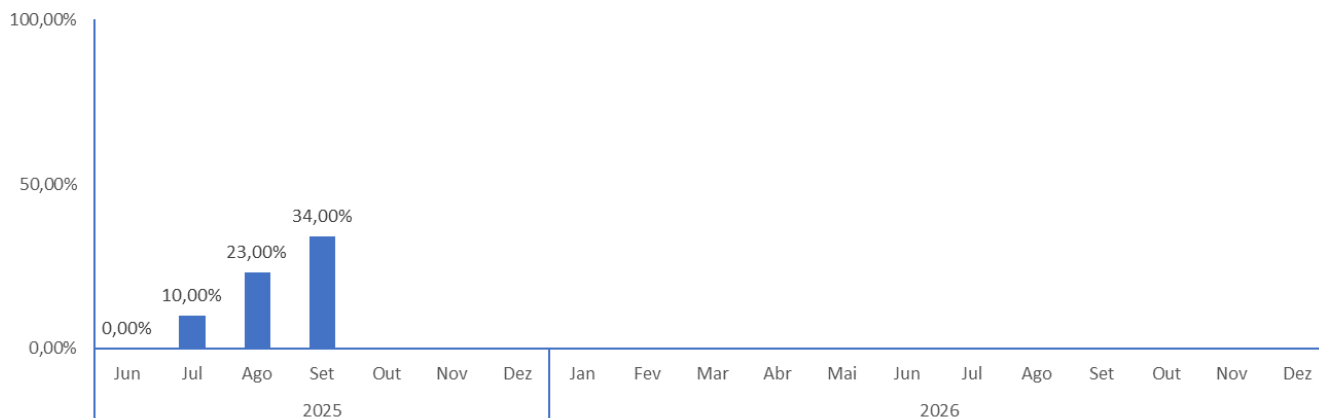

Implementação em relação ao biênio (%)



Departamento de Segurança da Informação (GABPRES/DESEG)

STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Refinamento das Configurações do WEB Application Firewall para Proteção das Aplicações Críticas do TJRJ– GRP 105

Síntese do Escopo

Ambiente de aplicações do Tribunal de Justiça protegidos contra ataques Cibernéticos

Gerente

Denise Marques Porto Alegre Rosa



Macrodesafio

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados


Objetivo estratégico

Promoção da proteção de dados organizacionais

Evolução do projeto

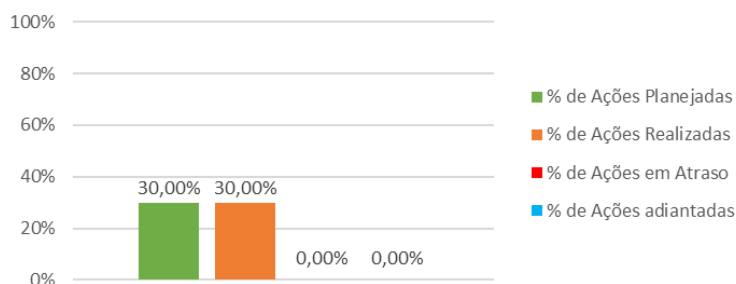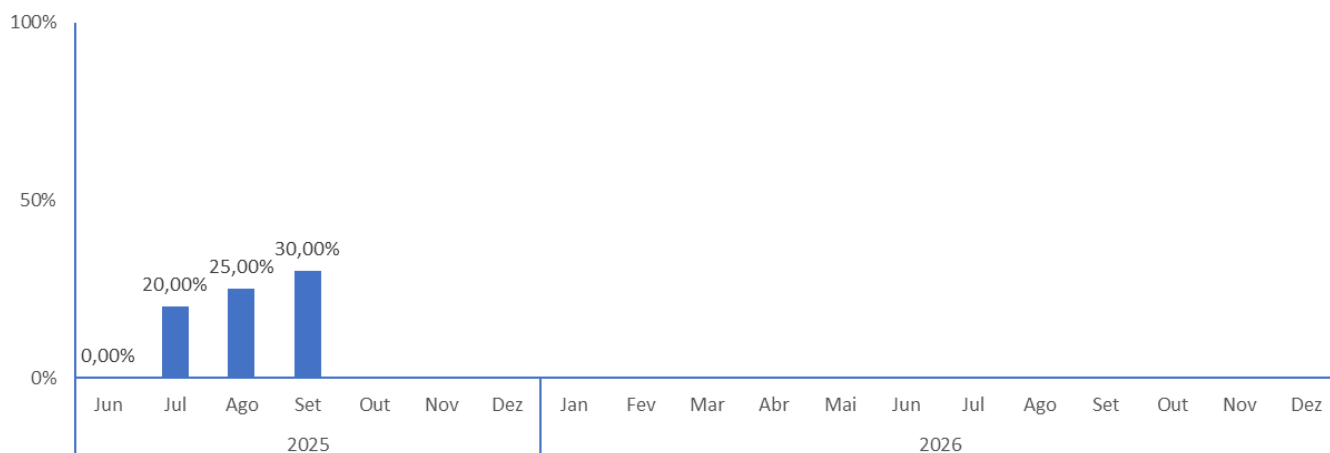

Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)

STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Aprimoramento dos mecanismos processuais com o uso da mediação para solução nos procedimentos apuratórios oriundos dos contratos administrativos firmados no âmbito no PJERJ – GRP 112

Síntese do Escopo

A adoção de métodos autocompositivos de resolução de controvérsias visando compor conflitos de interesse, no âmbito dos procedimentos apuratórios.

Gerente

Ubiratan dos Santos Vaz


Macrodesafio

Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para a resolução dos conflitos


Objetivo estratégico

Incremento da adoção de meios alternativos de composição de litígios

Evolução do projeto

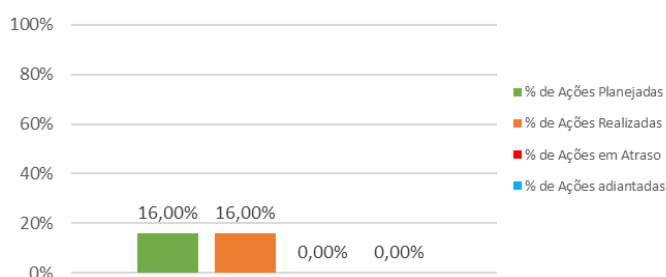

Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral de Gestão do Conhecimento (SGCON)

- Departamento de Difusão do Conhecimento

STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Aprimoramento da Difusão do Conhecimento— GRP 110

Síntese do Escopo

Instalação de Totens de LED em todas as unidades do PJERJ

Gerente

Aline de Oliveira Muller

Macrodesafio

Aperfeiçoamento da gestão e da governança judiciária



Objetivo estratégico

Aprimoramento da comunicação interna

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



- Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos

STATUS DO PROJETO

Bem-vindo ao Passado – GRP 104



EM ATRASO

Síntese do Escopo

Disponibilização de acervo de processos permanentes / históricos de alta relevância para sociedade em plataforma na rede mundial de computadores com a perspectiva de compartilhar a documentação no Projeto MoW - Memory of the Word, da Unesco.

Gerente

Márcio Ronaldo Leitão Teixeira



Macrodesafio

Aperfeiçoamento do conhecimento institucional


Objetivo estratégico

Aprimoramento da gestão do conhecimento institucional

Evolução do projeto

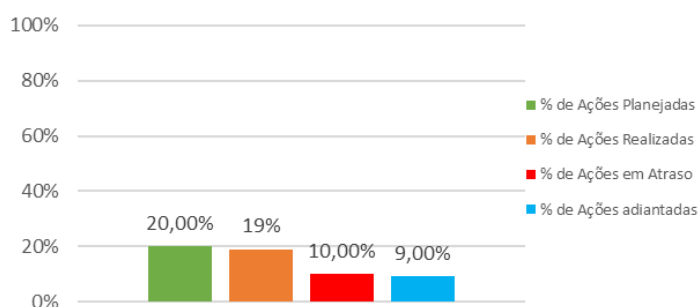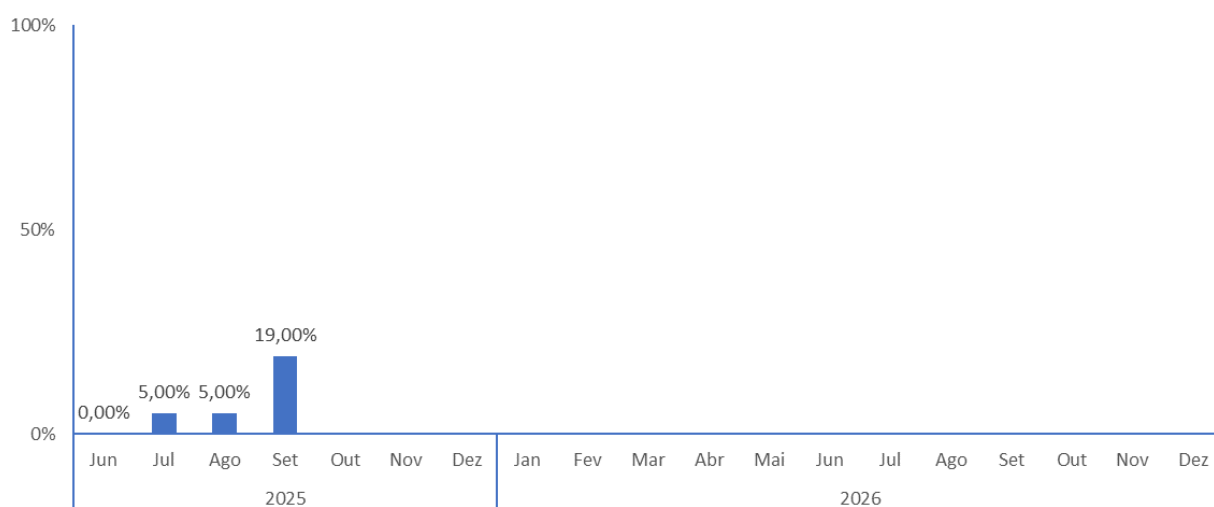

Implementação em relação ao biênio (%)



- **Ações em atraso no período:**

Nº	Descrição da ação	%
1.2	Realizar licitação para contratação da empresa	2,5
1.3	Proceder à contratação de empresa para digitalização de processos permanentes na Central de Digitalização de Processos Permanentes - CPDD	2,5
2.2	Certificar equipamentos (computadores e escâneres) da contratada na Central de Digitalização de Processos Permanentes no Arquivo de Itaipava.	2,5
2.3	Selecionar e contratar profissionais para atuar na Central de Digitalização de Processos Permanentes (CDPP) no Arquivo de Itaipava.	2,5

- **Análise Crítica:**

Em decisão presidencial constante no processo SEI 2023-6085096 em 22/9/2025 foi autorizada a instauração de procedimento licitatório visando à contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização do acervo permanente. O certame está previsto para 9/10/2025

Ações Gerencias:

Acompanhar a licitação que será realizada no dia 9/10/2025

Secretaria-Geral de Segurança Institucional (SGSEI)

STATUS DO PROJETO



EM ATRASO

Implantação do Monitoramento e Gestão de Alarmes Presencial e Pânico dos Fóruns e Comarcas do Estado do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Segurança do PJERJ (CISPJ) – GRP 106

Síntese do Escopo

Gerir Segurança Predial, Patrimonial e de Pessoas.

Gerente

Ricardo Paz Vila

Macrodesafio

Infraestrutura, Logística e Segurança


Objetivo estratégico

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)

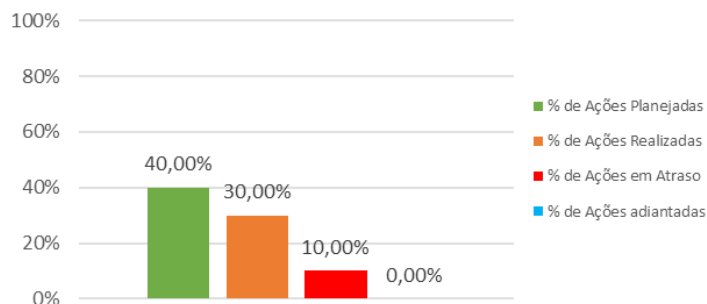

• Ações em atraso no período:

Nº	Descrição da ação	%
2.1	Execução da tramitação do ciclo da licitação	5,0
2.3	Contratar empresa vencedora	5,0

STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Solução de automação para operação das salas de acautelamento com recurso de intertravamento por monitoramento de imagens e reconhecimento facial – GRP 107

Síntese do Escopo

Gerir Segurança Predial, Patrimonial e de Pessoas.

Gerente

Ricardo Paz Vila


Macrodesafio

Infraestrutura, Logística e Segurança


Objetivo estratégico

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações

Evolução do projeto

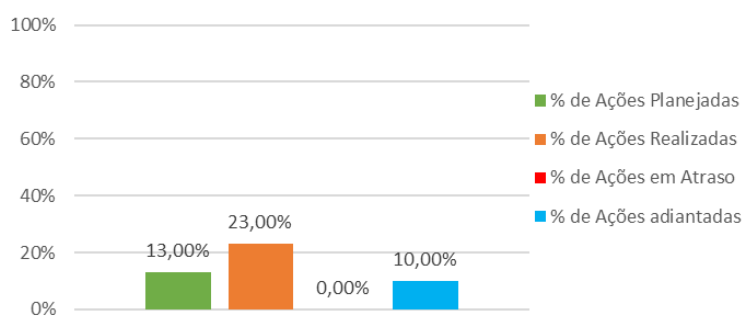

Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC)

STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

ASSIS – GRP 108

Síntese do Escopo

O Assistente Jurídico (intitulado como “Assis”) se destina a apoiar os magistrados na elaboração de decisões, minutas de sentenças e acórdãos em processos judiciais de 1ª e 2ª instância. Utilizando modelos de linguagem generativa, especificamente o GPT-4, o assistente é capaz de gerar automaticamente minutas de decisões, sentenças e acórdãos, além de responder a perguntas relacionadas ao conteúdo do processo. O assistente será projetado para atender tanto à 1ª instância quanto à 2ª instância, oferecendo suporte eficaz em ambas as fases do processo judicial.

Gerente

Maria Aline Lanini Cardoso


Macrodesafio

Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados


Objetivo estratégico

Aprimoramento dos sistemas institucionais e geração de inovações tecnológicas

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Implantação do Sistema e-Proc (continuidade) – GRP 103

Síntese do Escopo

Termo de Acordo de Cooperação Técnica, sem repasse de verbas, a ser celebrado entre este Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC, o Tribunal de Justiça do Acre - TJAC e o Tribunal de Justiça de Tocantins - TJTO, com fundamento no artigo 184 da Lei Federal nº 14.133/21, cujo objeto consiste na cessão do direito de uso do e-Proc, sistema de processo judicial eletrônico criado pelo TRF4, mediante o estabelecimento de condições de cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento permanente do referido sistema.

Gerente


Maria Clara Ciotola Guimarães

Macrodesafio


Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

Objetivo estratégico

Evolução do projeto

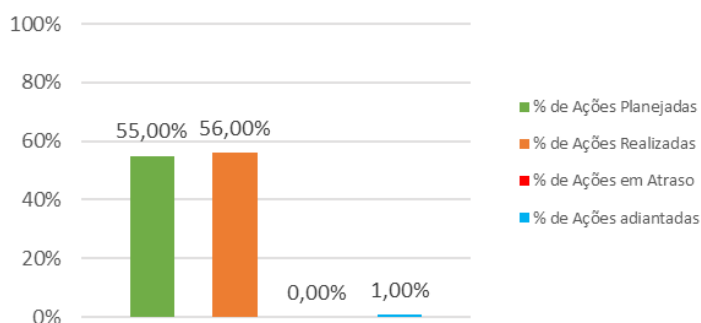

Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral de Dados Gerenciais e Análise de Indicadores (SGDAI)

STATUS DO PROJETO

Julgar + Metas 1 e 2 CNJ – GRP 116



NO PRAZO

Síntese do Escopo

Painéis de Monitoramento das Metas 1 e 2 CNJ – Magistrados 1º e 2º Graus.

Gerente

Angélica Cristina Pereira da Silva de Souza


Macrodesafio

Aperfeiçoamento da política de dados e informações institucionais


Objetivo estratégico

Aprimoramento da estrutura de dados como mecanismo de efetividade jurisdicional

Evolução do projeto

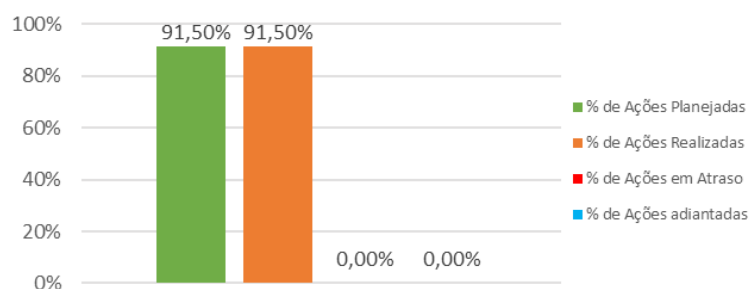

Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral Judiciária (SGJUD)**STATUS DO PROJETO****CONCLUÍDO****Adaptação da Resolução CNJ 591 às Rotinas da Sessão Virtual – GRP 115****Síntese do Escopo**

Rotina de sessão virtual atualizada conforme a resolução CNJ 591.

Gerente




Luiz Rogerio de Carvalho Fernandes

Macrodesafio

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Objetivo estratégico

Aprimoramento dos mecanismos de celeridade jurisdicional

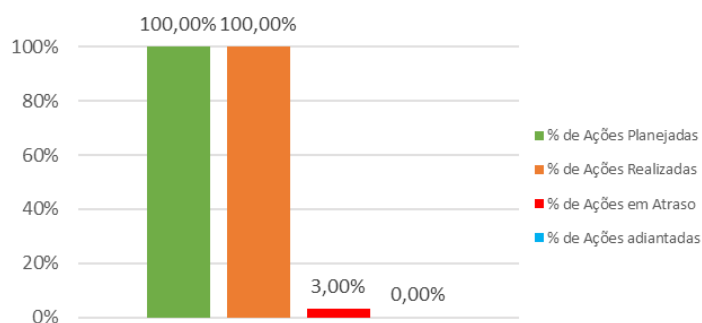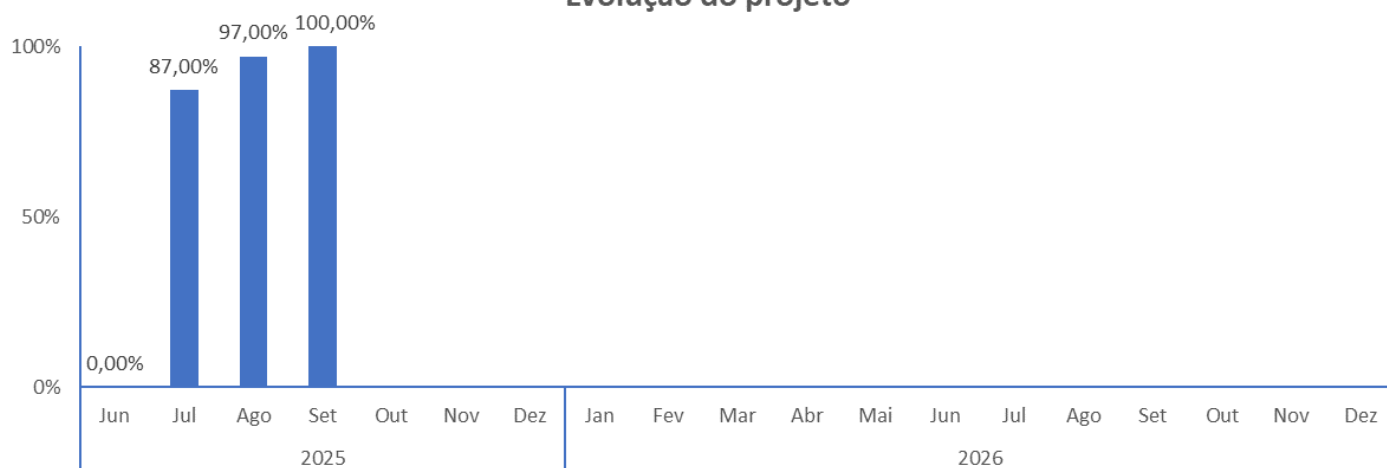Evolução do projeto**Implementação em relação ao biênio (%)**

Secretaria-Geral de Logística (SGLOG)

STATUS DO PROJETO

**EM ATRASO**

Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Continuidade) – GRP 71

Síntese do Escopo

Prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do TURJ, incluindo a manutenção preventiva, corretiva e análise dos sistemas instalados nas edificações.

Gerente

Anizia Christina Leite Souza

Elisete Pessoa dos Santos


Macrodesafio

Infraestrutura, logística e segurança


Objetivo estratégico

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, Servidores e edificações

Evolução do projeto

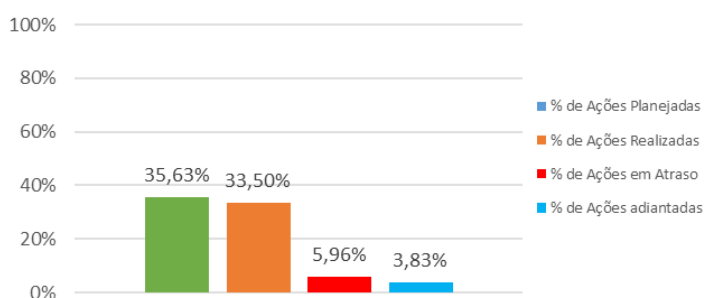

Implementação em relação ao biênio (%)



- **Ações em atraso no período:**

Foram identificadas ações em atraso nas seguintes entregas: Entrega 1, entrega 2, entrega 3, entrega 4, entrega 5 e entrega 6.

- **Análise Crítica:**

- ✓ Foi identificado um erro material na descrição das ações 545, 546, 547, 584, 1145, 1146, 1147 e 1148.
- ✓ Atualização financeira de acordo com o contrato licitado, atualização das edificações contempladas e atualização do plano de ação.

Ações Gerencias:

- ✓ Nas referidas ações, onde consta “Fórum da Comarca de Nova Iguaçu”, deve-se considerar “Anexo do Fórum da Comarca de Nova Iguaçu”. Ressaltamos que tal equívoco não impacta nos resultados de custos nem de pesos proporcionais das referidas ações.
- ✓ Foram atualizadas as ações relativas às entregas de determinadas edificações que não integram mais o escopo de edificações cedidas ou próprias do Tribunal. Além disso, as datas e a quantidade de ações por edificação foram redistribuídas, em conformidade com o novo plano de ação. Foi alterado o valor dos itens do projeto, se adequando aos valores do contrato vigente.

Secretaria Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS)

STATUS DO PROJETO

**NO PRAZO**

Programa de Descarbonização e Inovação Tecnológica Sustentável do TJRJ – GRP 113

Síntese do Escopo

Desenvolver e implantar o programa institucional de descarbonização do TJRJ, incluindo a implementação de pilotos tecnológicos (energia, mobilidade, eficiência energética, economia circular), capacitação e estruturação de políticas permanentes de sustentabilidade e neutralidade climática.

Gerente

Felipe Santos Dutra



Macrodesafio

Promoção da Sustentabilidade / Infraestrutura, logística e segurança


Objetivo estratégico

Gestão sustentável ambiental, de contratações e de documentos / Aprimoramento da Infraestrutura Institucional

Evolução do projeto

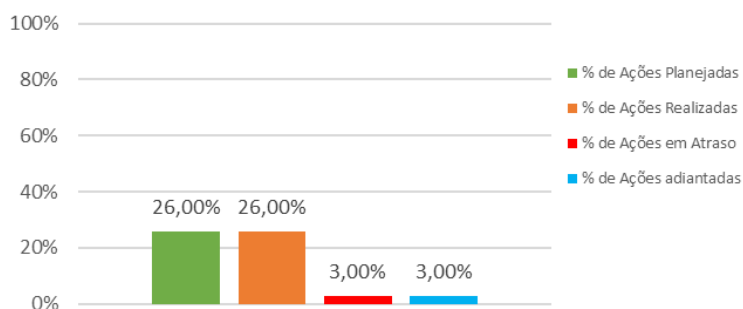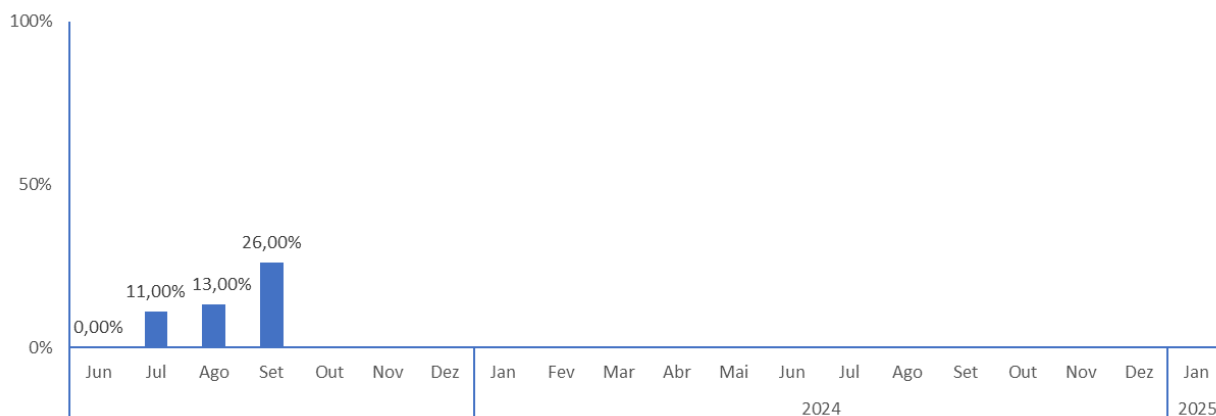

Implementação em relação ao biênio (%)



- **Ações em atraso no período:**

Nº	Descrição da ação	%
4.2	Apresentação dos resultados do estudo de mobilidade sustentável.	3

- **Análise Crítica:**

- ✓ Item 32 foi atualizado para execução total, pois foi identificado a existência de área interna que elabora serviços de automação predial;
- ✓ Item 51 foi avaliado pela equipe interna de manutenção mecânica e HVAC, onde foram identificadas restrições para a adequação dos sistemas atuais de ar condicionados para Gases menos poluentes;
- ✓ Item 42 encontra-se em execução, e tem sua data de conclusão prevista para 01/11/2025;
- ✓ Item 33 foi atualizado para execução total, pois foi identificado a existência de área interna que elabora serviços de automação predial;
- ✓ Item 62 encontra-se em curso, devidamente documentada no processo SEI 2025-06305173. O terceiro fórum de visita já está planejado e desta forma, a primeira etapa do processo será concluída, com sugestões de ações.

- **Ações Gerencias:**

- ✓ A área de automação predial será envolvida nos trabalhos de eficiência energética de descarbonização, não necessitando de contratação de empresa para instalação de automação;
- ✓ O item será marcado como concluído, e os resultados dos estudos serão apresentados para a SGSUS, alta administração e COSUS para estabelecimento dos próximos passos;
- ✓ Revisão do cronograma para atualização da data de conclusão da atividade;
- ✓ A área de automação predial será envolvida nos trabalhos de eficiência energética de descarbonização, não necessitando de contratação de empresa para instalação de automação;
- ✓ Manutenção do plano e definição das próximas etapas após apresentação do relatório da visita no processo e também à alta administração.

Diretoria-Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial (CGJ/DGFAJ)

STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Central de Atendimento da Primeira Instância – GRP 114

Síntese do Escopo

Redução do déficit na força de trabalho da primeira instância e implementação de um canal de atendimento de primeiro nível.

Gerente

Simone Ferreira Oliveira e Cruz


Macrodesafio

Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional /Fortalecimento da Relação do Judiciário com a Sociedade/Aperfeiçoamento da Gestão da Justiça Criminal/Aperfeiçoamento da Gestão e da Governança Judiciária/ Gestão de Pessoas


Objetivo estratégico

Aprimoramento e priorização das atividades de 1º grau/Promoção de parcerias com a sociedade civil/Aperfeiçoamento de rotinas cartorárias/Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão/Valorização dos Servidores e da carreira de Serventuário da Justiça

Evolução do projeto

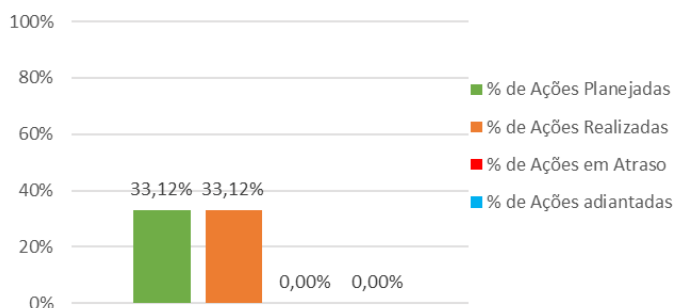

Implementação em relação ao biênio (%)



Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais (COJES)

STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Petição Cidadã- GRP 111

Síntese do Escopo

Novo sistema de peticionamento inicial para os Juizados Especiais Cíveis (seja pela reformulação completa dos atuais modelos-padrão ou pela criação de um formulário eletrônico), permitindo que o cidadão sem advogado possa preenchê-lo com maior segurança e autonomia.

Gerente

Priscilla Mariano Almeida



Macrodesafio

Garantia dos direitos fundamentais / Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Objetivo estratégico

Promoção da garantia dos direitos fundamentais / Aprimoramento e priorização das atividades de 1º grau

Evolução do projeto

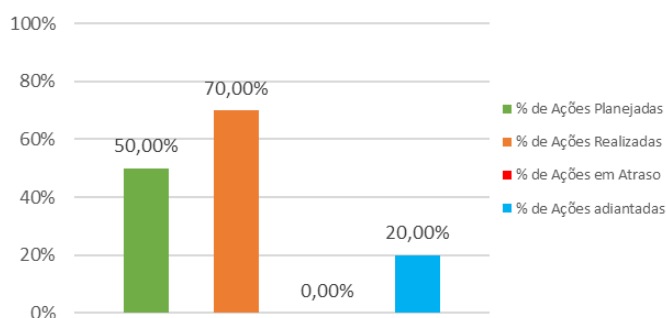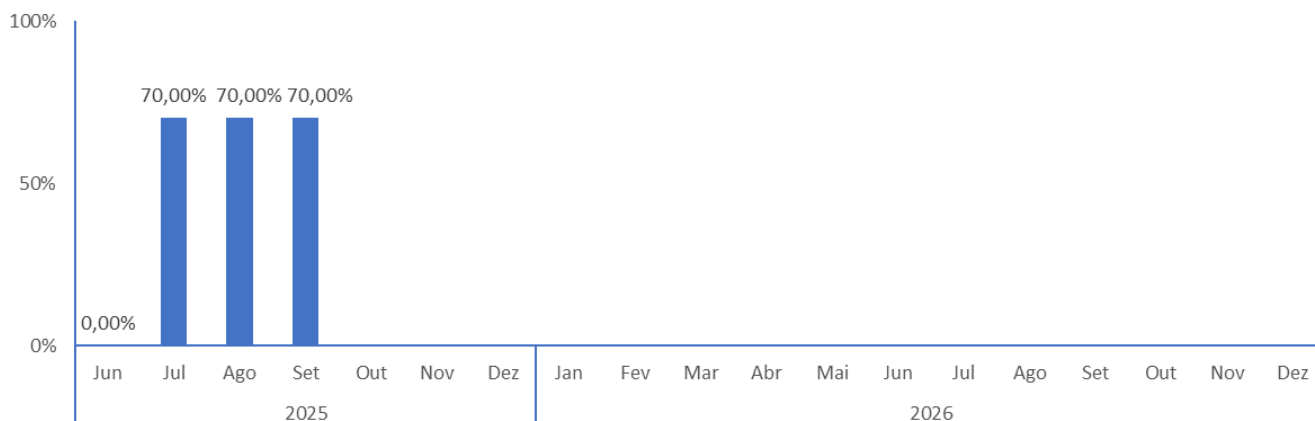

Implementação em relação ao biênio (%)

